



## Отчет

### по результатам экспертно-аналитического мероприятия «Мониторинг реализации на территории Липецкой области региональных составляющих федеральных проектов, входящих в состав национальных проектов»



#### Основание для проведения экспертно-аналитического мероприятия:

Закон Липецкой области «О Контрольно-счетной палате Липецкой области», пункт 13 раздела III Плана работы Контрольно-счетной палаты Липецкой области на 2022 год, приказ председателя Контрольно-счетной палаты №60 от 26.10.2022 года.

#### Объект (объекты) контроля:

Исполнительные органы государственной власти Липецкой области (управление жилищно-коммунального хозяйства Липецкой области).

#### Цель экспертно-аналитического мероприятия:

Оценить ход и итоги реализации региональных проектов на


территории Липецкой области («Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда (Липецкая область)»).

#### Сроки проведения экспертно-аналитического мероприятия:

с 26 октября по 31 декабря 2022 года



## Региональный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда (Липецкая область)»



В рамках регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда (Липецкая область)» (далее – региональный проект), входящего в состав подпрограммы 6 «Улучшение качества жилищного фонда, развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры Липецкой области» государственной программы Липецкой области «Обеспечение населения Липецкой области качественным жильем, социальной инфраструктурой и услугами ЖКХ», утвержденной Постановлением администрации Липецкой области от 13.12.2013 № 588 реализуется программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, расположенного на территории Липецкой области, на 2019 - 2023 годы».

**Основной задачей** регионального проекта является – **расселение граждан из аварийного жилищного фонда, признанного аварийным по состоянию на 01.01.2017 года, что соответствует цели стратегии социально-экономического развития Липецкой области («Устойчивое развитие жилищного и социально-культурного строительства для своевременного и полного удовлетворения спроса населения и социальной сферы»)** и **цели устойчивого развития ООН («Обеспечение открытости, безопасности, жизнестойкости и экологической устойчивости городов и населенных пунктов»)**.

Паспортом регионального проекта предусмотрено достижение к 2023 году целевых показателей «Количество граждан, расселенных из непригодного для проживания жилищного фонда» - **6,3 тыс. человек** и «Количество квадратных метров расселенного непригодного для проживания жилищного фонда» - **113,2 тыс. кв. м.**, что не соответствует показателям, установленным региональной программой переселения (**6,9 тыс. человек и 114,3 тыс. кв. м. соответственно**).



## Региональный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда (Липецкая область)»



Установленные паспортом регионального проекта целевые показатели за 2020, 2021 годы **выполняются в полном объеме:**

Показатели регионального проекта	Плановое значение			Фактическое значение			% достижения		
	2020г	2021г	2022 г	2020 г	2021 г	2022 г	2020г	2021г	на 01.09.2022г
Количество граждан, расселенных из непригодного для проживания жилищного фонда, тыс. человек	0,69	1,7	2,7	1,03	2,297	2,715	149,3	135,1	100,56
Количество квадратных метров расселенного непригодного для проживания жилищного фонда, тыс. кв.м.	12,33	30,46	48,57	15,829	35,2891	42,29	128,4	115,85	87,07

Учитывая, что целевые показатели регионального проекта **не охватывают 600 человек**, требующих расселения из непригодного для проживания жилищного фонда (признанного аварийным по состоянию на 01.01.2017 года) и **1,1 тыс. кв. м. площади** непригодного для проживания жилищного фонда, исполнение показателей, установленных паспортом, **не приведет к достижению цели федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда».**



## Региональный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда (Липецкая область)»



Кроме того, в ходе проверки установлено несоответствие данных о фактическом исполнении целевых показателей, указанных в отчете по мониторингу реализации региональных адресных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в части достижения целевых показателей по расселяемой площади и переселяемым гражданам с отчетом о ходе реализации регионального проекта за 2021 год, а именно:

Показатели регионального проекта	Исполнение (отчет о ходе реализации регионального проекта)	Исполнение (отчет по мониторингу программы по переселению)	Отклонения
Количество граждан, расселенных из непригодного для проживания жилищного фонда, тыс. человек	2,297	2,228	<b>-0,069</b>
Количество квадратных метров расселенного непригодного для проживания жилищного фонда, тыс. кв.м.	35,2891	33,942	<b>-1,3471</b>




Информация о фактическом исполнении областной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, расположенного на территории Липецкой области, на 2019 - 2023 годы» на основании отчетов о мониторинге программы переселения управления жилищно-коммунального хозяйства отражена далее.



# Финансирование областной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, расположенного на территории Липецкой области, на 2019 - 2023 годы» в рамках регионального проекта



## Плановые показатели

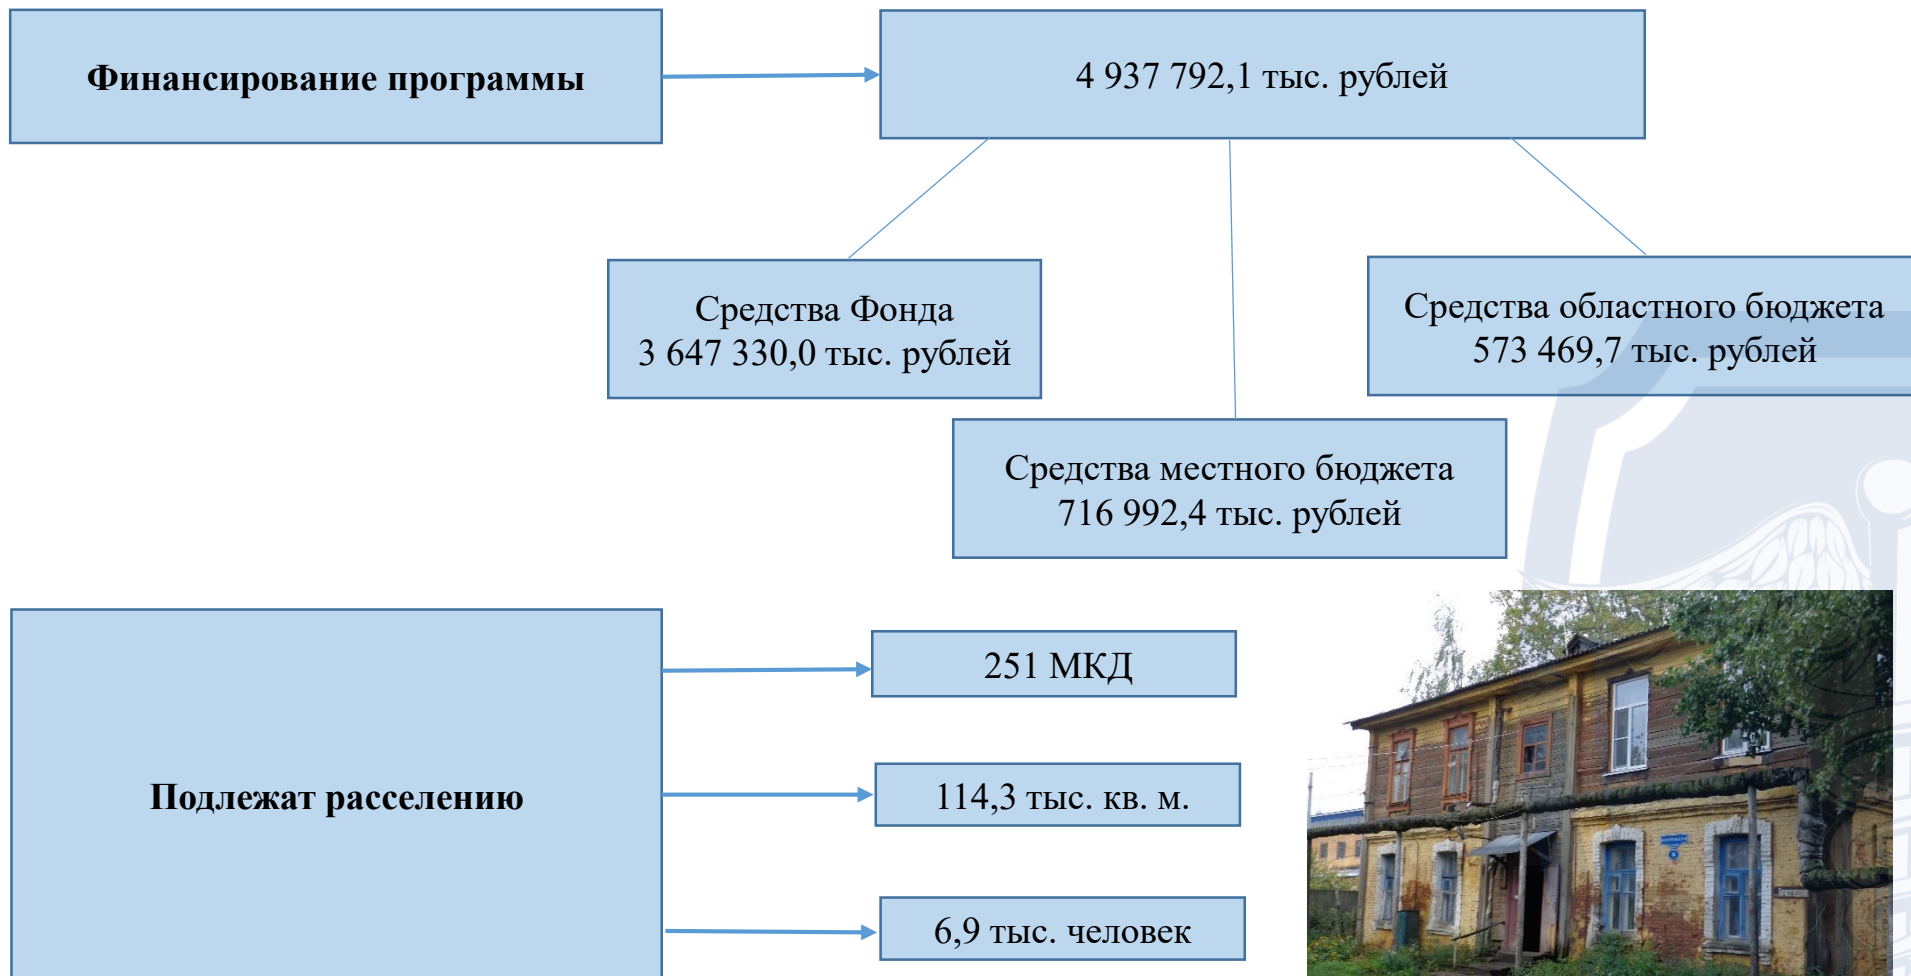



# Финансирование областной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, расположенного на территории Липецкой области, на 2019 - 2023 годы» в рамках регионального проекта



Фактическое исполнение на 01.09.2022

Финансирование

3 074 697,0 тыс. рублей

Средства Фонда  
1 918 017,9 тыс. рублей

Средства областного бюджета  
272 352,3 тыс. рублей

Средства местного бюджета  
884 326,8 тыс. рублей

Расселено

38,6 тыс. кв. м.

2,5 тыс. человек

**Осталось реализовать:**

75,7 тыс. кв. м. или **66,2%** от планового показателя

4,4 тыс. человек или **63,8%** от планового показателя





# Финансирование областной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, расположенного на территории Липецкой области, на 2019 - 2023 годы»



по состоянию на 01.09.2022 г.

Целевой показатель	План	Факт	% исполнения
Количество граждан, расселенных из непригодного для проживания жилищного фонда, тыс. человек	6,9	2,5	<b>36,2</b>
Количество квадратных метров расселенного непригодного для проживания жилищного фонда, тыс. кв.м.	114,3	38,6	<b>33,8</b>

	План *	Факт	% исполнения
Финансирование программы переселения, тыс. рублей	4 937 792,1	3 074 697,0	62,3

Не смотря на низкий процент исполнения целевых показателей 36,2% и 33,8%, в 2021 году регион взял на себя обязательства по выполнению программы переселения ускоренными темпами и мероприятия программы планируется **завершить в 2023 году**, вместо 2025 года.

Согласно ежемесячного отчета по мониторингу реализации программы переселения по состоянию на 01.09.2022 г., в отчетном периоде, исходя из запланированных обязательств, лимитов финансирования со стороны Фонда недостаточно, **дефицит финансирования составляет 1,71 млн. рублей.**

**Учитывая вышеизложенное, имеется риск невыполнения областной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, расположенного на территории Липецкой области, на 2019 - 2023 годы».**

\* Общее финансирование областной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, расположенного на территории Липецкой области, на 2019 - 2023 годы»



# Анализ рисков недостижения показателей федеральных проектов на основе факторов рисков, характерных для Липецкой области



Счетной палатой РФ в октябре 2022 года проводился опрос с целью выявления рисков недостижения показателей федеральных проектов на основе факторов, характерных для Липецкой области:

portalkso.ru Опрос Анализ рисков недостижения показателей федеральных проектов на основе факторов рисков, характерных для субъекта Российской Федерации за 9 месяцев 2022 год...

СККО События КСО СККО Союз МКСО Библиотека Форум Обучение Ссылки

Главная Мой кабинет Анкетирование Опрос Анализ рисков недостижения показателей федер...

## Опрос Анализ рисков недостижения показателей федеральных проектов на основе факторов рисков, характерных для субъекта Российской Федерации за 9 месяцев 2022 года (информация вносится не позднее 01.11.2022)

1. Наименование регионального проекта\*  
Наименование  
«Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда (Липецкая область)»
2. Код РП по КБК\*  
Код РП  
F3 - 42





# Анализ рисков недостижения показателей федеральных проектов на основе факторов рисков, характерных для Липецкой области



достижения показателей федеральных проектов на основе факторов рисков, характерных для субъекта Российской Федерации за 9 месяцев 2022 год...

### 3. Показатель ФП (для региона), по которому, по мнению КСО, необходима оценка риска\*

(анализируются показатели РП, связанные с ФП, по которым есть отклонения согласно отчетам о реализации РП, при необходимости, иные показатели РП, связанные с ФП)

- 3.1 «Количество граждан, расселенных из непригодного для проживания жилищного фонда, тыс. человек»;
- 3.2 «Количество квадратных метров расселенного непригодного для проживания жилищного фонда, тыс. кв.м.»;
- 3.3 «Достигнуто значение более 100% соотношения расселяемого непригодного для проживания жилищного фонда к признаваемому в соответствующем году» (по состоянию на 01.01.2017 г.).

### 4. Плановое значение показателя ФП (для региона)\*

Плановое значение показателя ФП (для региона)



- 4.1 «Количество граждан, расселенных из непригодного для проживания жилищного фонда, тыс. человек» - 6,3;
- 4.2 «Количество квадратных метров расселенного непригодного для проживания жилищного фонда, тыс. кв.м.» - 113,2;  
(600 нуждающихся человек не обеспечены доступным жильем площадью 1,1 тыс. кв.м.)

### 5. Оценка (КСО) уровня риска недостижения показателя ФП (для региона)\*

- Высокий
- Умеренный
- Низкий

### 6. Ключевые факторы риска недостижения показателя ФП (для региона)\*

достижения показателей федеральных проектов на основе факторов рисков, характерных для субъекта Российской Федерации за 9 месяцев 2022 год...

### 6. Ключевые факторы риска недостижения показателя ФП (для региона)\*

(от 1-го до 3-х факторов)

- 6.1 Отсутствие 100%-ого соотношения площади жилья, расселяемого непригодного для проживания жилищного фонда к признаваемому (расхождения между значениями показателей региональной адресной программы переселения и показателей регионального проекта);
- 6.2 Дефицит финансирования, в том числе за счет средств государственной корпорации - Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, составляет 1,71 млн. рублей (ежемесячный отчет по мониторингу реализации программы переселения на 01.09.2022 г.).



### 7. Подтверждение КСО по результатам анализа ключевых факторов рисков\*

- КМ
- ЭАМ
- Иное мероприятие КСО

Краткая информация по мероприятию / мероприятиям

Мероприятия, проводимые в соответствии с планом работы Контрольно-счетной палаты Липецкой области на 2022 год (утвержден решением коллегии Контрольно-счетной палаты Липецкой области (протокол от 28Л 2.2021 г. №19):

КМ – «Проверка законности и эффективности использования средств областного бюджета, выделенных в 2020-2021 годах и текущем периоде 2022 года на реализацию муниципальных программ, направленных на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малозатяжного жилищного строительства в рамках областной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, расположенного на территории Липецкой области, на 2019-»

### 8. Примечания\*

(ключевая информация по наиболее рисковому мероприятию, объектам в регионе, а также меры, принятые РОИВом, с оценкой результатов таких мер)

На данный момент Контрольно-счетной палатой Липецкой области планируется проведение коллегии, на которой будут рассмотрены результаты вышеуказанных мероприятий, а также даны предложения объекту проверки (период проведения мероприятий: сентябрь – октябрь 2022 года).



# Анализ рисков недостижения показателей федеральных проектов на основе факторов рисков, характерных для Липецкой области



Дзен | выступление кудрина био. | портал ксо счетная палат | Опрос Анализ рисков | X

portalkso.ru Опрос Анализ рисков недостижения показателей федеральных проектов на основе факторов рисков, характерных для субъекта Российской Федерации за 9 месяцев 2022 год...

## 8. Примечания\*

(ключевая информация по наиболее рисковым мероприятиям, объектам в регионе, а также меры, принятые РОИВом, с оценкой результатов таких мер)

На данный момент Контрольно-счетной палатой Липецкой области планируется проведение коллегии, на которой будут рассмотрены результаты вышеуказанных мероприятий, а также даны предложения объекту проверки (период проведения мероприятий: сентябрь – октябрь 2022 года).  
По итогам коллегии, данный вопрос будет поставлен на контроль с дальнейшим осуществлением мониторинга сотрудниками Контрольно-счетной палаты Липецкой области.

## 9 Контактная информация: КСО субъекта Российской Федерации\*

КСО

Контрольно-счетная палата Липецкой области

## 10 Контактное лицо\*

(Фамилия Имя Отчество исполнителя):

Гайдар Ольга Николаевна

16:11 31.10.2022 ENG



## Выводы по итогам экспертно-аналитического мероприятия



1. В рамках регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда (Липецкая область)» реализуется программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, расположенного на территории Липецкой области, на 2019 - 2023 годы».

Целевые показатели регионального проекта **не охватывают 600 человек**, требующих расселения из непригодного для проживания жилищного фонда (признанного аварийным по состоянию на 01.01.2017 года) и **1,1 тыс. кв. м. площади** непригодного для проживания жилищного фонда, исполнение показателей, установленных паспортом, что **не приведет к достижению цели федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»**.

2. Установлено **несоответствие данных о фактическом исполнении целевых показателей**, указанных в отчете по мониторингу реализации региональных адресных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в части достижения целевых показателей по расселяемой площади и переселяемым гражданам с отчетом о ходе реализации регионального проекта за 2021 год (**завышение исполнения регионального проекта составило 1,3 тыс. кв.м.**).

3. Не смотря на низкий процент исполнения целевых показателей регионального проекта «Количество граждан, расселенных из непригодного для проживания жилищного фонда» и «Количество квадратных метров расселенного непригодного для проживания жилищного фонда» 36,2% и 33,8% соответственно, в 2021 году регион взял на себя обязательства по выполнению программы переселения ускоренными темпами и мероприятия программы планируется завершить в 2023 году, вместо 2025 года.

Кроме того, согласно ежемесячного отчета по мониторингу реализации программы переселения по состоянию на 01.09.2022 г., в отчетном периоде имеется **дефицит финансирования в сумме 1,71 млн. рублей**.

Учитывая вышеизложенное, **имеется риск недостижения показателей федерального проекта, в рамках которого реализуется региональный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда (Липецкая область)»**.



## Предложения по итогам экспертно-аналитического мероприятия



### **Управлению жилищно-коммунального хозяйства Липецкой области:**

- инициировать обращение к руководителю федерального проекта по вопросу корректировки целевых показателей;
- откорректировать объем фактического исполнения регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда (Липецкая область)».

